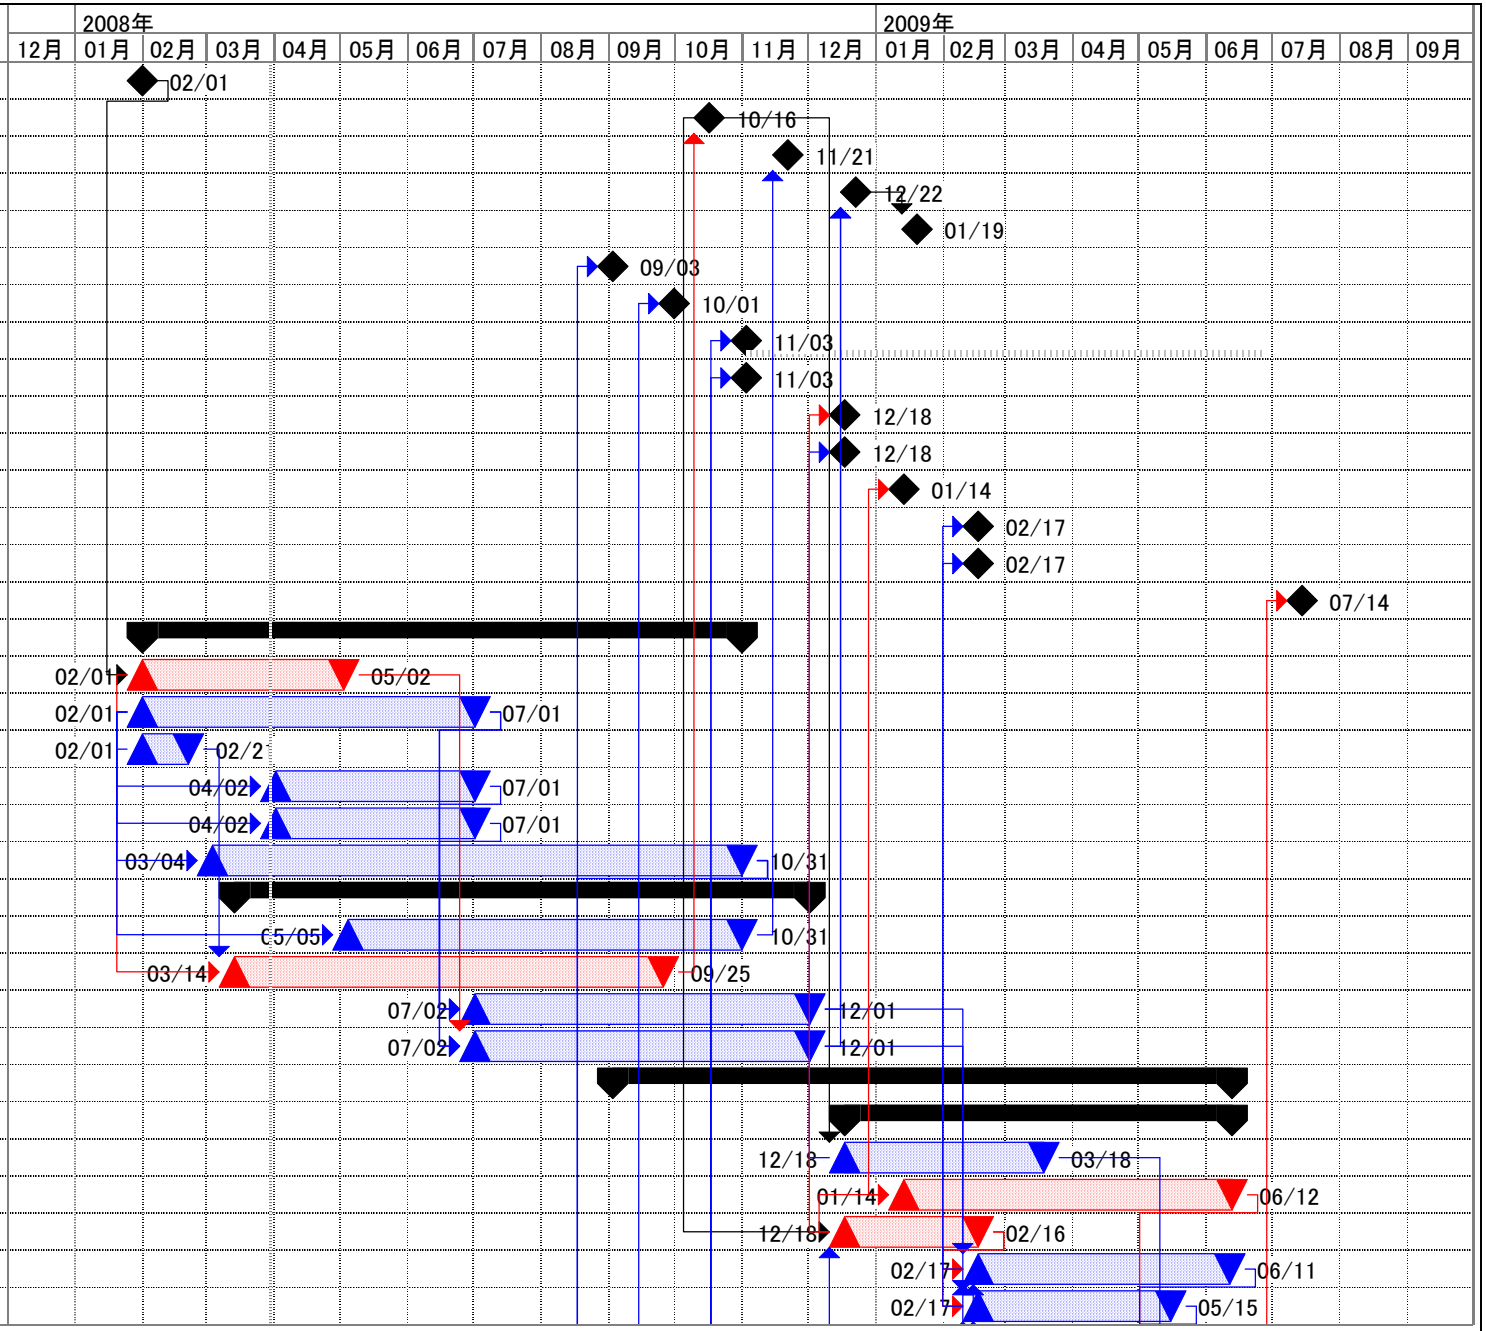ID	タスク名	期間
1	プロジェクト開始日	0日
2	第一船の船積	0日
3	第二船の船積	0日
4	第三船の船積	0日
5	最終船の船積	0日
6	パイル工事開始	0日
7	基礎工事開始日	0日
8	ストラクチャー工事開始日	0日
9	パイプラック工事開始日	0日
10	機器据付け工事開始日	0日
11	配管プレファブ開始日	0日
12	配管サイト工事開始日	0日
13	電気工事開始日	0日
14	計装工事開始日	0日
15	機械的完工	0日
16	設計フェーズ	196日
17	基本設計	66日
18	配管設計	108日
19	機器仕様	15日
20	電気仕様書	65日
21	計装仕様書	65日
22	土木設計/鉄骨製作	174日
23	調達・納入フェーズ	187日
24	配管資材発注／納期	130日
25	機器発注／納期	140日
26	電気資材発注／納期	109日
27	計装資材発注／納期	109日
28	建設フェーズ	203日
29	配管工事	127日
30	配管プレファブ	65日
31	配管工事	108日
32	機器据付け工事	43日
33	電気工事	83日
34	計装工事	64日
